

Выполнение работ по благоустройству пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади в г. Североморск

Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Между Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области и администрацией ЗАТО г. Североморск заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 28 «января» 2021 года № 5/ИМБТ на сумму 34 530 000,00 руб., из них областной бюджет 33 030 000,00 руб. и местный бюджет 1 500 000,00.

Между Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области и администрацией ЗАТО г. Североморск заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «22» января 2021 г. № 47730000-1-2021-016 на сумму 80 000 000,00 руб.

Всего сумма на проект 114 530 000,00 руб., из них: ФБ = 80 000 000,00 руб.; ОБ = 33 030 000,00 руб., МБ = 1 500 000,00 руб.

По результатам проведения электронного аукциона 22.01.2021 с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Норд» (далее – Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0149200002320008602-02 на выполнение работ по благоустройству пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади в г. Североморск (далее – Контракт), цена которого составляет 114 525 544,00 руб.

Сроки выполнения работ по Контракту: с 22.01.2021 по 15.09.2021.

Согласно условий Контракта, работы выполняются по этапам:

1. этап I – Разработка проектно-сметной (далее – ПСД) и рабочей документации по благоустройству пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади в г. Североморск (в т.ч. технические решения, прохождение государственной экспертизы, разработка детализации проектной документации для выдачи на строительную площадку).
2. этап II – Благоустройство пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади в г. Североморск.

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного:

Для размещения объекта по ул. Сафонова.

Общая площадь проектируемого благоустройства – 24795,52 кв.м

Площадь застройки бетонными парапетами – 242 кв.м

Площадь асфальтобетонного покрытия – 17015,00 кв.м

Площадь покрытия из бетонной плитки – 2001,72 кв.м

Площадь восстановления газона – 5500,00 кв.м

Площадь лестничных переходов – 36,80 кв.м

Для размещения объекта по Приморской площади.

Общая площадь проектируемого благоустройства – 2008,67 кв.м


Площадь лестничных переходов – 50,70 кв.м

Площадь покрытия из бетонной плитки – 1583,67 кв.м

Площадь восстановления откоса (рулонный газон) – 351,00 кв.м

Площадь бетонных парапетов – 23,30 кв.м

До начала выполнения работ

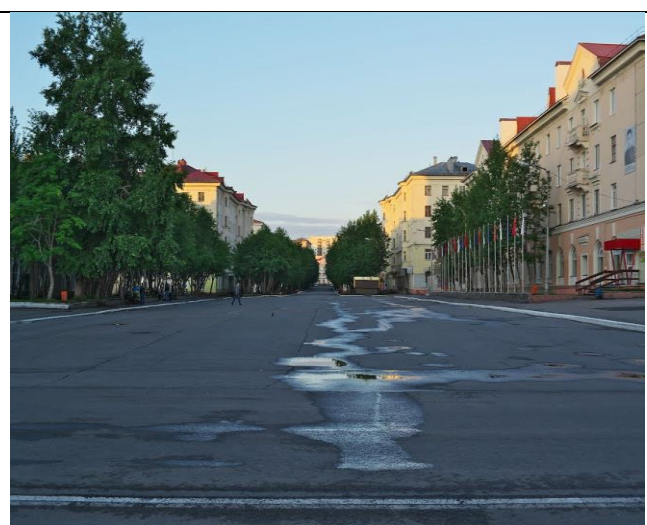



В процессе выполнения работ

